A-273
坂井輪排水区坂井輪幹線55管更生工事

工期　着工　令和2年　3月23日
　　完成　令和3年　3月15日
新潟市西区東青山1丁目他地内

請負者名：株式会社　レックス

現場代理人：鈴木　莞爾
監理技術者：徳永　直樹
坂井輪排水区坂井輪幹線

工種	種別	細別	規格	単位	数量
準備工				式	(1.0)
設計照査				式	(1.0)
事前調査工				式	(1.0)
管渠更生工	材料費	プロファイル		m	(10,565.8)
	内面被膜工	製管工	製管工（自走式自由断面）	m	(66.4)
			プロファイル溶接工	箇所	(20.0)
		裏込注入工	注入口取付工	ｽﾊﾟﾝ	(1.0)
			支保工兼浮上防止工（製管径800mm以上）	m	(66.4)
			注入工	m³	(91.00)
			支保材損料（矩形）	ｾｯﾄ	(35.0)
			注入用内部配管材損料（A）	m	(66.4)
			注入用内部配管材損料（B）	m	(66.4)
		管口仕上工	流入管口切断シール工	箇所	(1.0)
			流入管口切断シール工	箇所	(1.0)
		機械器具損料	機械器具損料（詳細）	式	(1.0)
	仮設備工	製管設備工	製管設備設置撤去工	回	(12.0)
			巻出しリング作成工（自由断面）	回	(1.0)
		製管機据付・撤去工	製管機搬入組立工	回	(1.0)
			製管機分解搬出工	回	(1.0)
	直接経費	特許使用料	特許使用料	式	(1.0)
	換気工	換気設備工	送風機運転	日	(36.0)
管渠洗浄工（更生断面□3400mm×3400mm）				m	(66.4)
換気工	送風機運転　150/180(m³/min)			日	(2.0)
止水工				m	(31.3)
後片付け工				式	(1.0)

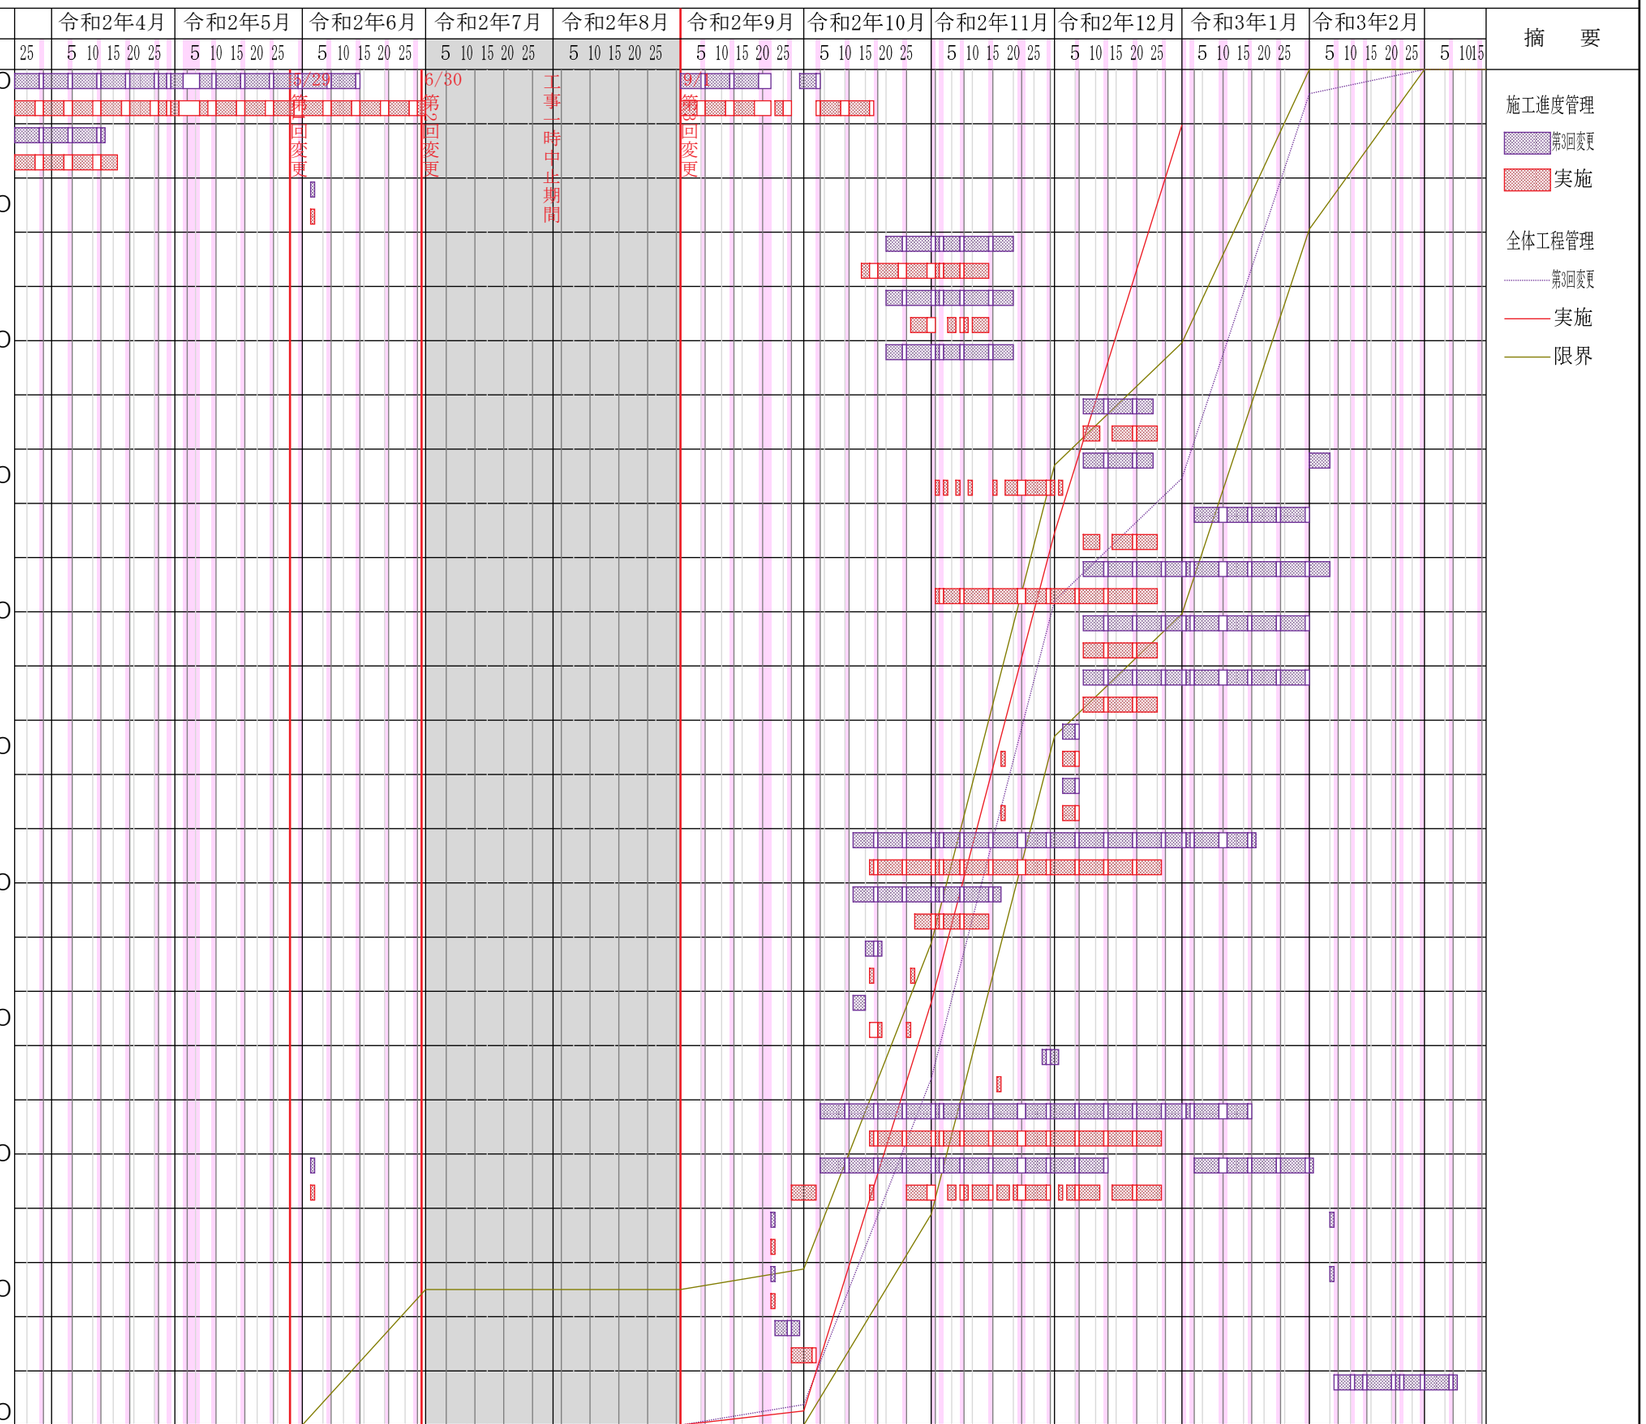

摘要

施工進度管理
- 第3回変更
- 実施

全体工程管理
- 第3回変更
- 実施
- 限界

全体（金額）工程												
							(1.52)	(25.56)	(60.81)	(69.85)	(98.22)	(100.00) (100.00)
				0.00			1.05	31.18	65.81	95.91		

記事
（指示・検討・是正事項）
